

चुरे गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना. तेस्रो

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को
वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



चुरे गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
घरखेडा कैलाली



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना
चुरे गाउँपालिका सहयोग इकाई
घरखेडा कैलाली

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश	4
नतिजा १ :खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २ :जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	6
नतिजा ३ :जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	7
नतिजा ४ :क्षमता विकास.....	7
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	9
१. पृष्ठभूमि	9
३. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	10
४. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	16
५. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	18
६. नीति तर्जुमा.....	19
७. सहकार्य.....	19
८. आइपरेका समस्याहरु	19
अनुसूची १ :यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	21
अनुसूची २.१ :यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	23
अनुसूची २.२ :गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	25
अनुसूची २.३ :आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था	25
अनुसूची ३ :गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	26
अनुसूची ४ :भिजिविलिटी.....	27
अनुसूची ५ :जनशक्ति विवरण.....	28

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	चुरे गाउँपालिका
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावण २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 16 th July 2020)

क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत:	३४०६५	२६२०५	२६२०५	७७
	कार्यक्रम / चालु:	११०८२	८१६४	७६११	६९
	जम्मा:	४५१४७	३४३६९	३३८१६	७५
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	४६६२	३०७८	३०७८	६६
	नेपाल सरकार	११४८५	११४८५	१०९३२	९५
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२९०००	१९८०६	१९८०६	६८
	जम्मा (WRDF):	४५१४७	३४३६९	३३८१६	७५

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

	उपभोक्ताको (Cash)	४०२	४०२	४०२	१००
	उपभोक्ताको (Kind)	१२,५०५	१२,५०५	११,२७८	८७
	जम्मा (उपभोक्ता):	१२,९०७	१२,९०८	११,६८१	९०
	कुल जम्मा:	५८,०५४	४७,२७५	४५,४९५	७८

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	७	७	२८
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	५	५	५
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	२८०९	२५३५	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	२१७९	०	
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	०	०	०
संस्थागत शौचालय (IPO)	१	१	१
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	२००	१७१	
चांग (घर संख्या)	२००	१७१	
अन्य (घर संख्या)			
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक		२७२	
दोस्रो पटक		१६५	
तेस्रो पटक		१२	
चौथो पटक		०	
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	२	०	
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	३००	२००	
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	१०	१०	
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	५	५	
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	१२	१२	
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि	१	०	

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु			
--	--	--	--

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	०	०
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)	१	०	०
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	११६	०	०
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	१
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)	०	०	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	३४८
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	०	०	०
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	३०	३०	९८
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)	३	३	३
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	२०	१८	५३
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	१	१	१
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	४३६	४३६	१५६६
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	४३६	४३६	१५६६
Advanced Livelihood			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	४	४	७
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	११३	११३	२७२
लघुउध्म तथा कृषि व्यवसायको संख्या	४	४	९
लघुउध्म तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	१०९०	१०९०	१०९५
गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	१६	१६	५३
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	२	२	४
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा	४३६	४३६	१५६६

सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	८६	८६	८६

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	२००	१२१	३५०
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१२००	६२७	२७२७
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या	१	१	४
सुधारिएको घट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१२६	१२६	५८६
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	६	६	१५
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१२	१२	१०८
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	१	१२

नतिजा ४: क्षमता विकास

- क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश: खानेपानी योजनामा चरणबद्ध कार्यपद्धित अन्तरगत कुल ५० वटा तालिम सन्चालन भइ सोबाट ६६९ जनाको क्षमता विकास भएको छ ।
- सरसफाइ स्वच्छता तथा जनचेतना तालिममा ५०१ जना सहभागी भइ समुदायस्तरमा सरसफाइ र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार आएको छ ।
- जिविकोपार्जन अन्तर्गत ६७७ जनाले तालिम प्राप्त गरी घरबारी व्यवस्थापन र आयआर्जनमा

सलग्न भइसकेका छन् ।

- गाउँपालिकास्तरमा २३ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरी उनीहरूको क्षमता विकास भइ खरिद प्रक्रीयामा र उपभोक्ता परिचालनमा सहज भएको छ ।
- ७ जनाले मात्रौभुमि सुधारिएको चुलो तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ। नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस चुरे गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।४।३२ गते स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, चुरे गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेषण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम रु ४,५१,४७,९४०। मध्ये रु ३,४३,६६,९०८। निकाषा भई रु ३,३७,९९,५९०। (७५%) खर्च भएको छ। जसमा नेपाल सरकारको ९४% दातृ निकाय फिनल्याण्ड सरकार र युरोपीयन युनियनको ६८% र स्थानीय सरकार चुरे गाउँपालिकाको ६६% खर्च हुन गएको छ भने नेपाल सरकारको चालु तर्फ निकाषा रकमबाट रु. ६४९,३९८।०० रकम फ्रिज भएको छ। कुल पुजीगत खर्च रु २,६२,०४३,६७। र चालु खर्च रु ७५,९५,२२३। भएको छ। स्थानीय तहबाट योजनाहरूमा सम्पुरक कोषको रु ३,०७,८२,३४२। खर्च भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २१ वटा भौतिक निर्माण तर्फ खानेपानी सरसफाई, जिविकोपार्जन पूर्वाधार, लघुउद्यम, सुधारिएको घट्ट, सुधारिएको चुलो निर्माणका योजनाहरू मध्ये १३ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ११ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सारी गएका छन्। माथि उल्लेखित सम्पन्न योजनाहरूबाट ८०८ घरधुरीका ५४६६ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा चुरे गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

३. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना” को कार्यान्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना निर्माण भइसकेपछि ७ वटा खानेपानी योजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
- गुरुयोजनाको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि किसीमको विवाद नहुने र योजनाको काम समयमै सम्पन्न हुनेमा गाउँपालिका आशावादी रहेको देखिन्छ ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना अन्तर्गत पुजीगत निर्माण तर्फ ३० वटा टनेल घर, २ वटा लघुउद्धम योजना, १ वटा हाइटेक नर्सरी निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने १ वटा हाट बजार सकलन केन्द्र, २ वटा तरकारी सकलन केन्द्र, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्।

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- ७ वटा खानेपानी योजनाको निर्माण चरणको काम सम्पन्न
- ५ वटा खानेपानी योजना कार्यान्वयन चरणमा
- १ वटा पूर्ण सरसफाइ सरचना निर्माण योजना सम्पन्न
- १ वटा सुधारिएको चुल्हो निर्माण योजना
- २ वटा जिविकोपार्जन योजना
- २ वटा लघुउद्धम योजना

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी	७	५६९९	७	५६९९	१००	१००

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

	योजनाहरू						
२	सिँचाई योजनाहरू	१	११६	०	०	१	०
३	संस्थागत चर्पीहरू (संख्या)	१	२१६	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	२०	५००	१८	४३६	९०	८७
५	सुधारिएको चुल्हो	२००	१२००	१२१	७२६	६०	६०
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	१	१२६	१	०	०	०
७	टनेल हाउस निर्माण	३०	१८०	३०	१८०	१००	१००
८	हाइटेक नर्सरी निर्माण	१	८५०	१	८५०	१००	१००

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी	साजगोठेरी काप्रापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे २	इन्टेक ५, सिसि २, काडेतार ५, आरिभटी ५, सार्वजनिक धारा १८, विद्यालय धारा १, मुख्य पाइपलाइन ५६३२ मिटर, शाखापाइप लाइन ३३३५ मिटर
२	खानेपानी	भैसीखर्क मालभुगा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे २	इन्टेक १४, सिसि १०, काडेतार १०, आरिभटी ५, सार्वजनिक धारा ३२,

			विद्यालय धारा १, मुख्य पाइपलाइन ४२६९ मिटर, शाखापाइप लाइन ८२३८ मिटर
३	खानेपानी	भुसेपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना चुरे २	इन्टेक ४, सिसि १, काडेतार ३, आरिभटी ३, सार्वजनिक धारा १८, विद्यालय धारा १, मुख्य पाइपलाइन ३४८६ मिटर, शाखापाइप लाइन २८८८ मिटर
४	खानेपानी	टेडीबजार खानेपानी तथा सरसफाई योजना चुरे ३	इन्टेक ४, सिसि ०, काडेतार ५, आरिभटी २, सार्वजनिक धारा ४, मुख्य पाइपलाइन ७२९ मिटर, शाखापाइप लाइन ७३८ मिटर
५	खानेपानी	गीथडा गजेना भालुखेला रन्तोला चुरे ६	इन्टेक ९, आकासे घैटो ३०, सिसि ०, काडेतार ७, आरिभटी ७, सार्वजनिक धारा ३०, विद्यालय धारा १, मुख्य पाइपलाइन ५८३६ मिटर, शाखापाइप लाइन ९४२८ मिटर
६	खानेपानी	डाडाखर्क कैनपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना चुरे ६	इन्टेक ६, सिसि १, काडेतार ६, आरिभटी ६, सार्वजनिक धारा २८, विद्यालय धारा १, मुख्य पाइपलाइन ६१६२ मिटर, शाखापाइप लाइन ७९५५ मिटर
७	खानेपानी	सिमलपानी मेलकट्टेश्वर बागछेडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना चुरे ६	इन्टेक ४, सिसि २, काडेतार ७, आरिभटी ४, सार्वजनिक धारा २२, मुख्य पाइपलाइन ४३९८ मिटर, शाखापाइप लाइन ४१२९
८	सरसफाई	स्वावलम्बी महिला साना किसान कृषि सहकारी पुर्ण सरसफाई संरचना चागं जुठ्यान निर्माण योजना चुरे ५	११४ वटा चागं जुठ्यान निर्माण
९	सुधारीएको चुल्हो	नीगाली कृषि सहकारी सुधारीएको चुल्हो निर्माण योजना चुरे १	१२१ चुलो निर्माण

१०	जिविकोपार्जन	ग्वासी समैजी टनेल हाउस निर्माण योजना चुरे १ अलाड	३० वटा पोलिहाउस निर्माण
११	जिविकोपार्जन	लघुउद्घ योजना निगाली कृषी सहकारी सस्था चुरे १ अलाड	मूल्य श्रृखला अन्तरगत २ हजार बोट सुन्तला र १ हजार बोट कागती वितरण
१२	जिविकोपार्जन	लघुउद्घ योजना स्वाबलम्बी महिला सहकारी चुरे ५ खानीडाडा	मूल्य श्रृखला अन्तरगत २ हजार बोट सुन्तला र १ हजार बोट कागती वितरण
१३	जिविकोपार्जन	केदार हाईटेक नर्सरी निर्माण योजना चुरे १ निगाली	१ वटा हाईटेक नर्सरी निर्माण

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	निर्माणाधिन योजनाहरुमा लकडाउनले बजार सामाग्रीको मूल्य वृद्धि हुदा कोटेशन अनुसारको दररेटमा समान आपूर्तिमा समस्या	काम सकिन लागेका योजनाहरुको हकमा दररेट संशोधन तथा गाउँपालिकाले विशेष निर्णय गरी सामान आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नेपर्ने।
२	सहयोगी संस्थामा कर्मचारी छनौट तथा परिचालनको समस्या सबइन्जिनियर छोड्ने दरमा वृद्धि, कर्मचारी छनौटमै धेरै समय खर्चिनु परेको	समयमै कर्मचारी परिचालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। अल्पकालीन रुपमा भएपनि सब इन्जिनियर खटाउनुपर्ने। समयानुसार सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने ।
३	गाउँपालिका सहयोग इकाईमा प्राविधिक सहजकर्तालाई कामको भार	योजनाको चाप भएका गाउँपालिका सहयोग इकाईमा पूर्णकालिन प्राविधिक सहजकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांशः
- खानेपानी योजनामा चरणबद्ध कार्यपद्धति अन्तरगत कुल ५० वटा तालिम सन्चालन भइ सोबाट ६६९ जनाको क्षमता विकास भएको छ ।
- सरसफाइ स्वच्छता तथा जनचेतना तालिममा ५०१ जना सहभागी भइ समुदायस्तरमा सरसफाइ र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार आएको छ ।
- जिविकोपार्जन अन्तर्गत ६७७ जनाले तालिम प्राप्त गरी घरबारी व्यवस्थापन र आयआर्जनमा

सलग्न भइसकेका छन भने १९ जना अगुवा कृषकहरुले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

♦ ७ जनाले मात्रीभूमि सुधारिएको चुलो तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	४४	८	१११	९२	२०३	२११	३५८	३११
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१६	२८	५६	४८	१९३	१६०	२६५	२३६
जीवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	८२	१७	११०	५७	२५२	१६७	४४४	२४१
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	३	२	१४	२	१७
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	३	०	९	८	३२	७०	४४	७८
जम्मा:	१४५	५३	२८६	२०८	६८२	६२२	१११३	८८३
प्रतिशत	९	९	२४	२४	६७	६७	१००	१००

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल

भएको छ ।

- घरबारी: यस आवमा ३०२ जनाले घरबारी व्यवस्थापन शुरु गरेका छन् ।
- आयआर्जन: यस गाउँपालिकामा १२९ जनाले आयआर्जनका लागि तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।
- सहकारी: यस आवमा चुरे गाउँपालिका अन्तर्गत २ वटा सहकारी सस्थालाई कम्प्युटर र प्रिन्टर उपलब्ध गराएको छ ।
- लघु उद्यम: यस आवमा ३४५ जनाले लघु उद्यम व्यवसाय शुरु गरेका छन् ।
- स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: यस आवमा २ जना जिविकोपार्जन र २ जना मर्यादित महिनाबारी स्वच्छता सहजकर्ता लाई तालिम प्रदान गरी परिचालन गरिएको छ ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	१५	५	६६	८६	१०	१०	३०	५०	२५	१५	९६	१४१
२	१४	१९	४१	७४	१६	८	१५	३९	३०	२७	५६	११३
३	८	२५	८०	११३	१२	०	२५	३७	२०	२५	१०५	१५०
४	४	३०	४८	८२	२	२०	२७	४९	६	५०	७५	१३१
५	३	२५	११५	१४३	५	१०	६०	७५	८	३५	१९०	२३३
६	४	५२	९०	१४६	८	१५	२९	५२	१२	६७	११९	१९८
जम्मा	४८	१५६	४४०	६४४	५३	६३	१८६	३०२	१०१	८६०	६४१	९६६

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	५	४	१२०	१२९
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	२३	५४	१६३	३४०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	५	५
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	४	४
५	एग्रोभेट	०	०	२	२
जम्मा		२८	५८	२९४	३८०

तलिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		स्वाबलम्बी महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	निगाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या			
क	सामुदायिक संस्था	१६		
ख	उपभोक्ता समिति	२	१	
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	०	०	
२	शेयर धनीहरुको संख्या	४०३	४२९	
क	महिला	४०३	१६५	
ख	पुरुष		२६४	
३	कुल सम्पत्ती रु.	३१९६८२१		
४	कुल ऋण लगानी रु	२४५४०००।००	३७२३८१४	
५	असूली दर	१००		
६	खुद नाफा रु	४१५७६।००		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०		
८	जगेडा कोष रु.	१०४३४६।	१४५६५	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१११	१०३	

४. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
---------	-------------	--	-----------------------------	---

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१.	साजगोठेरी काप्रापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे २	१	१	२
२.	भैसीखर्क मालभुगा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे २	१	१	२
३.	भुसेपानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे २	३	३	३
४.	टेडीबजार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे ३	३	३	३
५.	गीथडा गजेना भालुखेला रन्तोला चुरे ६	१	१	३
६.	डाडाखर्क कैनापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे ६	१	१	२
७.	सिमलपानी मेलकट्टेश्वर बागछेडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चुरे ६	१	१	२
८.	स्वाबलम्बी महिला साना किसान कृषि सहकारी चाग जुठ्यान निर्माण योजना चुरे ५	१	१	२
९.	निगाली कृषि सहकारी सुधारीएको चुल्हो निर्माण योजना चुरे १	१	१	२
१०.	गवासी समैजी टनेल हाउस निर्माण योजना चुरे १	३	३	३
११	लघुउद्ग योजना निगाली कृषि सहकारी सस्था चुरे १	१	१	१
१२	लघुउद्ग योजना स्वाबलम्बी महिला सहकारी चुरे ५	१	१	१
१३	केदार हाईटेक नर्सरी निर्माण योजना चुरे १	१	१	१

तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझाबहरुको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाब	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७७।०२।०६	पाइपलाईनमा भल तर्काउनु पर्ने	भल तर्काएको
२	२०७७।०२।१२	स्टर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने	सिमेन्टमा पानी नपर्ने गरी राखेको
३	२०७७।०३।२१	मुहानमा घेरबार गर्नुपर्ने	घेरबार गरेको

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	प्रगति प्रतिवेदन	६	६	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१९	१९	०

५. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

आव २०७६।७७ को भाद्रमा गाउँपालिका सहयोग इकाई र सहयोगी सस्थाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको उपस्थितमा योजना तर्जुमा गोष्ठी गरीएको थियो भने असारमा आएर प्रगति समीक्षा गरिएको छ ।

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७६।०४।१२	कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा
२	२०७६।०४।२०	वार्षिक प्रगति समीक्षा
३	२०७६।०५।२९	स्थानीय सेवा प्रदायक परिचालन सम्बन्धमा
४	२०७६।०६।२८	योजनाका पहिलो अनुगमन
५	२०७६।०८।०२	सहयोगी सस्था कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा
६	२०७६।०९।२२	मूल्य श्रृंखला जिविकोपार्जन सम्बन्धमा
७	२०७६।१०।०३	वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा
८	२०७६।१०।१४	थप जलस्रोत करार नियुक्ती
९	२०७७।०१।१६	कृषि उद्गम सहयोग कार्यक्रम
१०	२०७७।१।२९	बजेट सशोधन सम्बन्धमा
११	२०७६।२।१२	अल्पकालिन सेवा प्रदायक सम्बन्धमा
१२	२०७६।३।२	उसका बजार सामाग्री खरिद प्रक्रीया सम्बन्धमा
RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक		
१	२०७६।४।३१	• कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
२	२०७६।५।१४	• तयारी चरणका कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा
३	२०७६।९।१	• पहिले अनुगमन सम्बन्धमा
४	२०७६।१०।१२	• योजना दिगेपना तथ्याक सकलन सम्बन्धमा

५	२०७६।१।१३	● स्थानीय सेवा प्रदायक परिचालन सम्बन्धमा
६	२०७७।१।१५	● सरसफाई तथा सकलन सम्बन्धमा
७	२०७७।२।१६	● सुधारिएको चुलो अनुगमन सम्बन्धमा

६. नीति तर्जुमा

यस आवमा चुरे गाउँपालिकाले देहाय बमोजिमका नीति तथा निर्देशिकाहरू पारित गरेको छ ।

- जलस्रोत नियमावली २०७७
- मर्यादित महिनाबारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
- खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७

७. सहकार्य

परियोजनाले यस वर्ष प्लाष्टिक टनेल निर्माण कार्यमा गाउँपालिका कृषि शाखासँग सहकार्य गरेको छ । जसमा कृषि शाखाले १ लाख म्याचिग गरेको छ । त्यसैगरी जिविकोपार्जन पुर्वाधारतर्फ देउराली हाटबजार सकलन केन्द्रमा ५ न वडा कार्यालयसँग सहकार्य गरिएको छ । जसमा वडा कार्यालयले रु २ लाख लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृषाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	चुरे गापा कृषि शाखा	टनेल हाउस निर्माण	नगद	१ लाख
२	५ न वडा कार्यालय	हाट बजार निर्माण	नगद लगानी	२ लाख
३	गाउँपालिका	पूर्ण सरसफाइ महिनाबारी स्वच्छता अभियान दिवस	समान वितरण	३ लाख

८. आइपरेका समस्याहरू

सहयोगी सस्थाका कर्मचारीहरूको भर्ना र छोड्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदा चरणवद्ध क्रियाकलापमा ढिलाई हुन गयो। कोभिड १९ को महामारीले योजनाहरूमा कर्मचारी परिचालन गर्न गाह्रो भयो । जिविकोपार्जनतर्फ पूजीगत अनुदानको कार्यविधि ढिलाइ आउदा समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

सकिएन । खानेपानी तथा सिचाइ योजनाहरूको बजार सामग्री आपूर्तिमा लकडाउनले प्रभावित गर्यो ।

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	निर्माणाधिन योजनाहरूमा लकडाउनले बजार सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुदा कोटेशन अनुसारको दररेटमा समान आपूर्तिमा समस्या	काम सकिन लागेका योजनाहरूको हकमा दररेट संशोधन तथा गाउँपालिकाले विशेष निर्णय गरी सामान आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नेपने।
२	सहयोगी संस्थामा कर्मचारी छनौट तथा परिचालनको समस्या सबइन्जिनियर छोड्ने दरमा वृद्धि, कर्मचारी छनौटमै धेरै समय खर्चनु परेको	समयमै कर्मचारी परिचालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। अल्पकालीन रुपमा भएपनि सब इन्जिनियर खटाउनुपर्ने। समयानुसार सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने ।
३	गाउँपालिका सहयोग इकाईमा प्राविधिक सहजकर्तालाई कामको भार	योजनाको चाप भएका गाउँपालिका सहयोग इकाईमा पूर्णकालिन प्राविधिक सहजकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिका को खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
साजरगोठारी कप्रापानी खा.पा.तथा स.स.योजना		३४८२५१३	३२८३९६६	४२२९५५	५३३४२१	नजाने	०	२६८
भुसेपानी खा.पा.तथा स.स.योजना		२४४७६४१	२०८८५८०	२०८८५८०।०	५०००००	नजाने	०	२७४
भैसिखर्क मालबुङ्गा, छडिखोला खा.पा.तथा स.स.योजना		४८२६९५७	४१९९५१०	७७७४७०	७६७१३६	नजाने	०	५९१
सिमलपानी मेलकटेश्वर बागछेडा खा.पा.तथा स.स.योजना		३३७२०३२	२७६५१५६	२९७१३८	४६६०००	नजाने	०	३०८
डाडाखर्क कैनापानी खा.पा.तथा स.स.योजना		४९६३४९३	४३४६१८६	४९७४५५	७४९०४२	नजाने	०	३६३
गिथडा गौजेना भालुखोला रन्तोला खा.पा.तथा स.स.योजना		६०१५४३१	५६८६२१६	११८४०७०	११३७७२३	नजाने	०	५२९
टेडीबजार खा.पा.तथा स.स.योजना		१०२७६४०	९३५३५७	९३५३५७	१५१०००	नजाने	०	१९३
भित्रीखोला खा.पा.तथा स.स.योजना		७४५३५७०	५७९८८५९	५७९८८५९	०	जाने	१६५४७१	५३३
बसर हल्दाडी खा.पा.तथा स.स.योजना		२९८४९१२	२२५३२७१	२२५३२७१	१६१२७१	जाने	७३१६४१	४०६
ववेड सिवनगर खा.पा.तथा स.स.योजना		२३६६९८४	१६६२३७९	१६६२३७९	०	जाने	७०४६०५	२९६
ढुङ्गेपानी खा.पा.तथा स.स.योजना		२३५३९२९	११७६०००	११७६०००	०	जाने	११७७९२९	३१८
अलैंची जुकेपानी खा.पा.तथा स.स.योजना		७४६५५४५	३७३२०००	३७३२०००	०	जाने	३७३३५४५	६२६
जम्मा		४८७६०६५२	३७९२६६८०	२०८२५५३४	४३६५५९३		८००२४३३	२५२६
सिँचाई / बहुपयोगी योजना								
भुल्केखोला सिक्तेखोला सिंचाई	५	१२२०९९४	८४४३८७	८४४३८७	३४८०००	जाने	३७६६०७	११६
जम्मा:		१२२०९९४	८४४३८७	८४४३८७	३४८०००		३७६६०७	
संस्थागत शौचालय								

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

भगवती मा.वि. शौचालय निर्माण	६	१०८७३२६	५४३०००	५४३०००	०	जाने	५४४३२६	२८०
जम्मा:		१०८७३२६	५४३०००	५४३०००	०		५४४३२६	
सुधारिएको पानीघट्ट								
मेलगौराखोला	४	१६८५५९	१०००००	१०००००	०	जाने	६८५५९	७२
जम्मा:		१६८५५९	१०००००	१०००००	०		६८५५९	
सुधारिएको चुल्हो								
निगाली सहकारी मार्फत सुधारिएको चुलो निर्माण योजना	१,४	२८२१८६	२८२१८६	२८२१८६	१०९६००	नजाने		६६५
जम्मा:		२८२१८६	२८२१८६	२८२१८६	१०९६००		०	६६५
जिविकोपार्जन तर्फ								
ग्वासी समैजी प्लाष्टिक टनेल निर्माण	१	८६१८६६	८५३१७०	८५३१७०	१०००००	नजाने	०	१८०
श्री केदार हाइटेक नर्सरी निर्माण योजना	१	४७७९१०	४७७९०८	४७७९०८	०	नजाने	०	९००
निगाली कृषि सहकारी मार्फत मुल्य श्रृंखला कार्यान्वयन सहयोग योजना	१	४५२६४३	३९४४४३	३९४४४३	०	नजाने	०	५१०
स्वावलम्बी कृषि सहकारी मार्फत मुल्य श्रृंखला कार्यान्वयन सहयोग योजना	५	४४७२३८	३९०३००	३९०३००	०	नजाने	०	६००
देउराली हाटबजार टस निर्माण योजना	५	५६३३०८	३३७९८५	३३७९८५	०	जाने	२२५३२३	८४०
पालडी संकलन केन्द्र निर्माण	१	६६१२४९	३९६७४६	३९६७४९	०	जाने	२६४५०३	९५०
वगैचुला संकलन केन्द्र निर्माण	६	६५३२७३	३९१९६४	३९१९६४	०	जाने	२६१३०९	६५०
जम्मा		४११७४८९	३२४२५१६	३२४२५१९	१०००००		७५११३६	२१९०
कुल जम्मा		५६००३८७७	४३३०५४३६	४३३०५४३९	५०८४६६०		९७४३०६४	६१९५

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	परियोजना अभिमुखीकरण	१, ३, ६	१		३	१	९	७	२५	२४
२	सरसफाई जेसी तालिम	१, ३, ६	१		४	०	१०	८	२७	२९
३	आर्थिक व्यवस्थापन तालिम	१, ३, ६	१		१७	२	१२	२३	५४	५९
४	सामुदायिक कार्ययोजना तयारी तालिम	१, ३, ४ २६	१		३	२	७	८	१९	२१
५	निर्माण चरणको गोष्ठी	१, ३, ४ २६	१		४	१	८	११	६	३
६	घरबारी व्यवस्थापन तालिम	१, ३, ४ २६	१		६	१	८	१२	२४	२८
७	मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा तालिम	१, ३, ४ २६	१		७	१	४०	१६	३८	४१
८	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	१, ३, ४ २६	१		०	०	७	७	१०	६
सरसफाई, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	सरसफाई शृंखला तालिम	२	५							
२	विद्यालय सरसफाई तालिम			३	०	८	५	२१	४६	८३
३	सहयोगी सस्था पूर्ण सरसफाई तालिम	२		०	०	०	१	२	६	९
४	सरसफाई सप्ताह	७		१२	२८	४२	३५	१५५	७४	३४६
५	जलवायु अनुकुलन तालिम									
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	आयआर्जन तालिम	३		०	०	५	०	६०	२७	९२

चुरे गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

२	अगुवा कृषक तालिम	५		१	०	४	२	३	९	८
३	मूल्य श्रृंखला तालिम	२		०	०	२	२	९	१७	३०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	जलवायु अनुकुलन तालिम	२		०	०	३	२	१४	२	१७
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	उ.स. व्यवस्थापन तालिम			१	०	४	२	३	९	१९

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
0	0	0	0

अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
०	०	०	

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

१. “परियोजनाले नयाँ प्रविधि जडान गरेपछि सबैले साबुन पानीले धुन थाले हात”

कैलाली जिल्लाको साविकको सहजपुर गाउँ विकास समिति हाल चुरे गाउँपालिका (गाउँपालिका अस्थायी केन्द्र) ३ नं. वडा कार्यालयमा खानेपानी र सरसफाईको अवस्था नाजुक थियो । तत्कालिन सहजपुर गाविसमा परियोजनाले वि.स.२०७० साल देखि काम गर्न थाले पछि पहिलो योजना सहजपुर गाविस र वरिपरि रहेका अन्य कार्यालयका लागि ठागुडाडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण भयो । जसबाट १० घरधुरी समुदाय र तत्कालिन गाविस, स्वास्थ्यचौकी, ग्वासी प्राथमिक विद्यालय, कृषि सेवा केन्द्र लगायतका कार्यालयहरूलाई पानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । २०७६ मा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले चुरे गाउँपालिकामा कार्यक्रम संचालन गर्दै गर्दा विश्व महामारीको रुपमा देखा परेको कोरना भाइरसले यहाँ पनि सक्रमणको त्रास फैलियो । खानेपानीको व्यवस्था भएपनि हात धुने उचित व्यवस्था नहुदा मिति नजिकै रहेको शौचालय गएर हात धुनेको संख्या प्रायः सुन्य नै देखिन्थ्यो ।




हाल परियोजनाले नयाँ प्रविधिसहितको धारामा र साबुमा हात नलागाएर धुने स्टेशन जडान गरेपछि जनप्रतिनिधि देखि कर्मचारी तथा सेवा ग्राही सबैले हात धुने गरेका छन् । कोरना महामारीको सक्रमणलाई कम गर्नमा यस प्रविधिले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त बहादुरको सक्रियताले सबै कर्मचारीहरूले सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन थालेका छन् । ३ नं. वडा कार्यालय पनि रहेको सहजपुरमा यो प्रविधि जडान भएपछि अरु वडाका वडा अध्यक्षहरूले पनि यस कार्यको प्रशंसा गर्दै ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनालाई यस्तै प्रविधि जडान गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेका छन् ।

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	मिडिया परिचालन	२०७७।०३।२०	परियोजना डकुमेन्ट्री
२	मिडिया परिचालन	२०७७।०४।१२	आय व्यय विवरण
३	स्टीगर, ब्यानर, भित्तेलेखन	विभिन्न मितिमा	हात धुने तरिका, कोभिड १९ के बारेमा

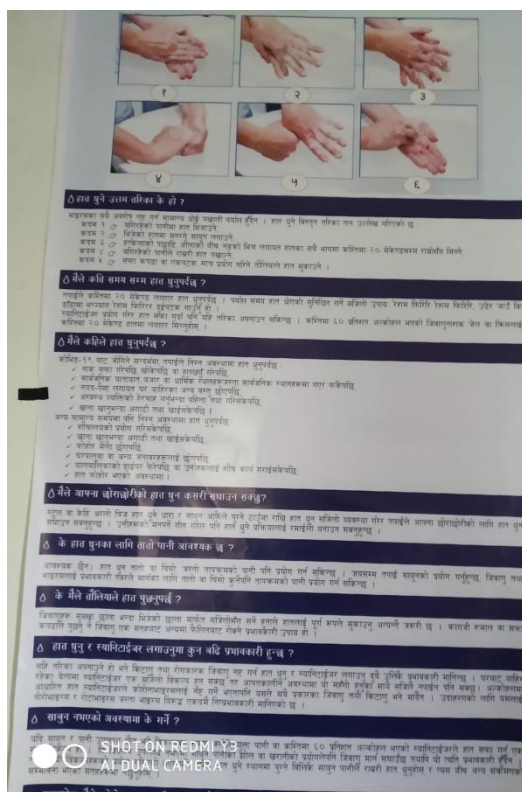

अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	पुर्णानन्द अवस्थी	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना कैलाली	गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत	१२
२	नरेन्द्र सिंह बिष्ट	ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना चुरे कैलाली जोरायल डोटी	प्राविधिक सहजकर्ता	६
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
१	दयानन्द जोशी	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	फिल्ड संयोजक	६
२	माया जोशी	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	फिल्ड संयोजक	१२
३	हेम राज जोशी	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२
४	बेद प्रसाद जैशी	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	जलश्रोत प्राविधिक	१२
५	नन्दराम थापामगर	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	जलश्रोत प्राविधिक	१२
६	माधव प्रसाद जोशी	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	जलश्रोत प्राविधिक	१२
६	मोहन बहादुर सिंह	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	जलश्रोत प्राविधिक	१२
७	गंगा बम	चुरे गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र बैतडी	जलश्रोत प्राविधिक	१२

