

बडिकेदार गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना, तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



बडिकेदार गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
खड्यौलि
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
“

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमि	3
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	4
२.२. भौतिक प्रगति	4
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	9
५. नीति तर्जुमा	11
६. सहकार्य	11
७. आइपरेका समस्याहरु	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	13
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	14
अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्ययोजनाहरुको अवस्था	15
अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था	16
अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था	16
अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	17
अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी - घरबारी , सरसफाई, संरचना निर्माण	18

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	बडिकेदार गाउपालिका				
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण				
प्रतिवेदनको समयावधी	१ श्रावण २०७५ देखी ३१ आषाढ २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)				
क. आर्थिक प्रगती सारांश					
परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	४०८१।	४०५१.७२५।	४०५१.७२५।	९९.२८
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	२२८६।	२२८१.२७२।	२२११.१७४।	९६.७२
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	६३६७	६३३२.९९७	६२६२.८९९	९८.३६
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३७०२।	५५५०.०१२।	५५५०.०१२।	१४९.९१
	नेपाल सरकार	६११६।	६११६।	६०२९.९१२	९८.५९
	दातृ निकाय (GoF/EU)	६३६७।	६३३२.९९७	६२६२.८९९	९८।३६
	जम्मा	१६१८	१७९९.९००९	१७८४.२८२३	११०.२७
	उपभोक्ताको Cash	७७१७	७७१७	७७१७	१००
	उपभोक्ताको Kind	७०३५.९८६	७०३५.९८६	७०३५.९८६	१००
	जम्मा	७८०७.६८६	७८०७.६८६	७८०७.६८६	१००
	कुल जम्मा	२७१७.७६८६	१७९९.९००९	२५६५.०५०९	
ख. भौतिक प्रगती सारांश					
नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी				
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	○ दुईओटा खानेपानि योजना सम्पन्न ○ एउटा सिचाई कुलो निर्माण सम्पन्न ○ १ वटा छात्राशौचालय निर्माण सम्पन्न नया ○ ३ खानेपानी योजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेका ○ १ सिचाई योजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेका ○ १ वटा छात्रा शौचालय योजना निर्माणधिन आस्थामा				
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	○ १४ ओटा पलाष्टिक घर निर्माण सम्पन्न भई टमाटरको बेर्ना सारीएको छ । ○ १८ ओटा नयाँ घरवारी व्यवस्थापन समुहहरु गठन तथा परिचालन				

	○ ५ जना नर्सरी नाईकेलाई तालिम तथा परिचालन ○ ११ जना अगुवा कृषकहरूलाई तालिम तथा परिचालन ○ ७५१ घरधुरीले घरवारी व्यवस्थापन तालिम लिई घरवारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	○
नतिजा ४ : क्षमता विकास	○ ७ जनाले ९ दिने ग्रामीण मर्मतसंभार कार्यकर्ता तालिम लिई खानेपानी र सिचाई निर्माणमा पाईप जडानमा सहजीकरण भएको छ । ○ १८ वटा घरवारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ○ १२ वटा घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पुर्नताजगी तालिम ○ ५ वटा योजनामा पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिम ○ १ वटा खानेपानी सरसफाई र सुसासन सम्बन्धी तालिम ○ १ वटा अगुवा कृषकलाई तालिम ○ १ वटा सुधारिएको चुलो निर्माण तालिम ○ वडा नं ५लानामा पुर्ण सरसफाई बारे जनचेतना कार्यक्रम ○ ५ जना कृषकलाई बहुउद्देशिय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम ○ पाँच ओटा विभिन्न योजनाहरूमा चरणबद्ध कार्यतालिका अर्न्तगतका विभिन्न तालिमहरू संचालन ○ १ जना स्थानिय श्रोत व्यक्तिलाई क्षमता विकास तालिम दिई परिचालन गरिएको छ । ○ पाँच ओटा योजनामा चरणबद्ध कार्यपद्धतिका कृयाकलाप संचालन ○ गा.पा पधाधिकारीहरूलाई खानेपानी सरसफाई तथा सुसासन सम्बन्धि तालिम ○ सहयोगि संस्थाका कर्मचारीहरूलाई परियोजना अभिमुखिकरण तालिम ○

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।४।१ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा फिटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९९।४६ प्रतिशत रकम निकास भै ११०.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु ८६०८८। रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु ७००९८। परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहको विनियोजित रु ५५५००९२। मध्ये रु. ५५५००९२। खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १०० % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका ११ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरु मध्ये ३ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने ५ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु आगामी वर्ष समेत निरन्तर रुपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सारी गएका छन् साथै दुई ओटा खानेपानी योजना र एउटा सिचाई योजना निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम किस्ता भुक्तान गर्न बाँकी रहेका छन् ।

यस प्रतिवेदनमा वडिकेदार गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चालु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- दुईओटा खानेपानि योजना सम्पन्न (चाचरा र उदुपूर्ण खा.पा)
- एउटा सिचाई कुलो निर्माण सम्पन्न (भेल्लुडा सिचाई योजना)
- १ वटा छात्राशौचालय निर्माण सम्पन्न (केदारेश्वर उ.मा.वि. रन्तोला)

नया

- ३ खानेपानी योजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेका - (गुडगुडे , चौताडी, उदगडा खा.पा)
- १ सिचाई योजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेका (निगाला सिचाई योजना)
- १ वटा छात्रा शौचालय योजना निर्माणधिन अवस्थामा (मेलघट्टी आ.व.)
- २ वटा डिकेबन र विपीनगर खा.पा योजना उ.स. गठन

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	२	५९७	२	५९७	२	५९७
२	सिँचाई योजनाहरु	१	२१३	१	२१३	१	२१३
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	३००	१	३००	१	३००
४	घरवारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	२०	२७५०	१८	२२९३	१८	२२९३
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	८००	५६००	८००	५६००	८००	५६००
६	चाड जुठ्यान	८००	३८२८	६०९	३३४९	६०९	३३४९
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
७	पोखरी संरक्षण	०	०	०	०	०	०
८	मुल संरक्षण	०	०	०	०	०	०
९	अन्य	०	०	०	०	०	०

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भएका वा सिचाईको व्यवस्थाभएको टोलहरुमा घरवारी व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु संचालन गर्ने रणनीति भएकोले	○ प्रारम्भिक सर्वेक्षणका आधारमा घरवारी व्यवस्थापनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने
२	लक्ष अनुसार सामग्री बाढीएको तर खेतिपातीका कारणले समुदायले भनेको समयमा निर्माण नगरेकोले चाड जुठ्यानको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको ।	○ यस्ता संरचना निर्माण गर्दा मौसमि पात्रो निर्माण गरि गर्ने साथै समुदायको मागको आधारमा उनिहरुले गर्ने नगद अनुदान तथा श्रमदानको कुरा निश्चित भई सकेपछि मात्र गर्ने ।
३		○

४		○
५		○

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन योजनाहरूको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. वडिकेदार गाउँपालिका पदाधिकारीहरूलाई खानेपानी सरसफाई सुसासन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न पश्चात खानेपानी सिचाई उ.स. मा महिला र पुरुषमा बैठक तथा गोष्ठीमा सहभागीता रहेको छ ।
२. वडिकेदार गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ का अगुवा कृषक समुहलाई ५ दिने तालिम सम्पन्न भई घरमा आफु कृषक र अरु कृषक बेमोसमी तरकारी उत्पादनमा सहजीकरण गरेका छन् ।
३. वडिकेदार गाउँपालिका वडा नं १ र ५ का महिला तथा पुरुषलाई सुधारिएको चुलो सम्बन्धी ७ दिने तालिम दिई तालिम प्राप्तले घरघरमा चुलो निर्माणमा सहजीकरण गरेको छ ।
४. गाउँपालिका स्तरीय सरसफाई सम्मेलन २२९ जनाको सहभागीता सम्पन्न भएको छ
५. वडिकेदार गा.पा वडा नं ३ र ५ (लाना र घागल) १८ वटा घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिई सहभागीता महिला ५३९ र पुरुष २१२ जना गरी कुल जम्मा ७५१ जना सहभागी भई घरघरमा मौसमि तथा बेमोसमी तरकारी उत्पादन गरी ताजा तरकारी उपभोग एवम आयआर्जनमा वृद्धि गरिरहेका छन् ।
६. वडिकेदार गा.पा वडा नं ३ र ५ (लाना र घागल) महिला २ जना र पुरुष ५ जना गरी ७ जनाले ग्रामीण मर्मत कार्यकर्ता सम्बन्धी ७ दिने तालिम लिई खानेपानी र सिचाई योजना निर्माणमा सहजीकरण भईरहेको छ ।
७. वडिकेदार गा.पा वडा नं ३ र ५ (लाना र घागल) मा विभिन्न दिवश(चर्पी , नारी ,महिनावरी सरसफाई स्वच्छता , राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह दिवशमा) ८१५ जना सरोकारवालहरू सहभागी भएका छन् ।
८. वडिकेदार गा. पा वडा नं ५ का ५ वटा पुरानो खानेपानी संरचना निर्माण उ.स.लाई पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिममा सहभागी ६७जना (महिला र पुरुष) सहभागी भएका छन् । खानेपानी योजना समितिले कोष खडा गरी संरचनाको दिगोपन बारे जानकारी छन् ।
९. १४ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण सम्पन्न
१०. ५ जनालाई बहुउद्देशीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम दिई नर्सरी स्थापन गरी तरकारी उत्पादन गरैको पाईन्छ ।
११. ८०० घरधुरीमा सुधारिएको चुलो र ६०९ घरधुरीमा च्यागं र जुठ्यान सम्पन्न ।

तालिका ४ :क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	८८	३२	१	२	३७९	४२३	४६८	४५७
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१०९	६४	९२	९३	४४४	३०५	६३५	४६२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	११५	३५	५७	५३	३९५	१२४	५३९	२१२
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	१	०	१	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	५	२	२	२	१५	४३	२२	४७
जम्मा								
प्रतिशत :								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : १८ वटा समुहलाई घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम र १२ वटा समुहलाई पुर्नताजगी तालिम, र १४ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण

२.आयआर्जन :१८ वटा समुहलाई घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम र १२ वटा समुहलाई पुर्नताजगी तालिम,१४ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण

३.सहकारी:

४.लघु उद्यम :

५.स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : ३ जना महिला

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	०	०	०	०	३८	१४०	२४७	४२५	३८	१४०	२४७	४२५
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	२४	५०	२६६	३४०	११२	४७	२८१	४४०	१३६	९७	५४७	७८०
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा	२४	५०	२६६	३४०	१५०	१८७	५२८	८६५	१७४	२३७	७९४	१२०५

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती प्लाष्टिक घर	०	०	१४	१४
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	५	५
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
जम्मा					

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

बिजय विकास बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	३			
२	शेयर धनीहरुको संख्या	२९६			
३	कुल सम्पत्ती रु.	१९८६१५०			
४	कुल ऋण लगानी रु.	१२७६८८०			
५	असूली दर	९०.२१			
६	खुद नाफा रु.	९५७५६			
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.	५०००			
८	जगेडा कोष रु.	२७१०७२			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१.५२			

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।११।१५ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ८: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१.	चाचरा खा.पा	१	१	५
२	उदपुर्ण खा.पा.	२	२	८
३	उद्गडा खा.पा	२	२	८
४	गुडगुडे र जेवलेखोला खा.पा	२	२	८
५	चौताडी खा.पा	२	१	६
६	निगाला सिचाई योजना	१	१	८
७	भेल्लुडा सिचाई योजना	१	१	८
८	केदारेश्वर उ.मा.वि. रन्तोला छात्रा शौचालय निर्माण	२	२	८
९	मेलघट्टी आ.व. अतरकाडा छात्रा शौचालय निर्माण	१	१	६
	जम्मा			

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा			

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७५-०९-१० देखि ०९-१२	○ धाराको रकम संकलन गर्ने ○ मुहान दर्ता प्रकृयालाई अगाडी बढाउने ○ ढोका नभएका चर्पिहरुको ढोका व्यवस्थापन तथा चर्पि नै नभएका घरधुरीहरुले तुरुन्तै चर्पि बनाउने आदी	
२	२०७६-०२-३२ देखि ०३/०१ सम्म	○ प्रत्येक योजनामा योजना कितावको व्यवस्था गरि नगदी तथा जीन्स खाताहरु अध्यावधि गर्नु पर्ने । ○ गोठेमल व्यवस्थापन नगरेका घरधुरीहरुले जति सक्दो चाडो गोठेमल को उचित व्यवस्थापन गर्ने । आदी	

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरु गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७५/०८/१३	● जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन गोष्ठी ● सहयोगि संस्थाको छोटो सुचि
२	२०७५/०८/२०	● प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा
३		●
४	२०७५/०९/५	● जनप्रतिनिधिलागि सुशासन तथा सुधारिएको चुलो र डकमी तालिम सम्बन्धमा
५	२०७५/०९/१५	● योजना स्तरीय अनुगमन तथा प्रतिनिधित्वमा सम्बन्धमा
६	२०७५/०९/२६	● चर्पी दिवस सम्बन्धमा
७	२०७५/०९/११	● सहकारी सम्झौता सम्बन्धमा ● आगामी वर्षको योजना तर्जुमा सम्बन्धमा
८	२०७५/१०/२३	● योजनास्तरको पहिलो अनुगमन सम्बन्धमा
९	२०७५/११/१४	● गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत व्यवस्थापन सम्बन्धमा
१०	२०७५/११/१५	● गा.पा स्तरीयपरियोजनाका क्रियाकलाप अनुगमन कार्यदल गठन सम्बन्धमा ● थप जनशक्ति परिचालन सम्बन्धमा
११	२०७५/१२/२५	● ०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा

		● सहयोगी संस्था अर्न्तगत थप कर्मचारी सम्बन्धमा ● गाउँपालिका कोषको अनुगमनका सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा
१२	२०७६।१।१६	● हल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ● चालु शिर्षक रकमान्तर सम्बन्धमा ● योजनाको अन्तिम अनुगमन सम्बन्धमा ● पुर्ण सरसफाई कार्ययोजना बैठक सम्बन्धमा
१३	२०७६।०३।१०	● आगामी आ.व.को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा ● फिल्ड कोर्डिनेटर गणेश जोशीको राजनीमा सम्बन्धमा
१४	२०७६।०।२२	● योजनाको अन्तीम अनुगमन ● प्रगति समिक्षा ● सरसफाई सप्ताह मनाउने

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. जीविकोपार्जन सुधार योजना

२.

३.

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	सुआहारा कार्यक्रम	पुर्णसरसफाई प्रवर्द्धन	फिल्टर खरीद तथा बितरण	६००००।
२	घरेलु विकास	पुर्णसरसफाई प्रवर्द्धन	सुधारीएको चुलो प्रवर्द्धक तालिम	७००००।
३	ग्रामिण समुदाय विकास केन्द्र । सुआहारा परियोजना । वडा कार्यालयहरू	सरसफाई सप्ताह मनाउने	प्राविधिक तथा आर्थिक	४०००।
४				

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	जीविकोपार्जन सहजकर्ता नहुदा घरवारी व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु व्यवस्थापन गर्न कठिनाई	○ बोगटान गाउँपालिकामा कार्यरत जीविकोपार्जन सहजकर्ता हरीहरनारायण भट्टले समय मिलाएर यस गाँपामा कृयाकलाप संचालनमा सहयोग एवम सहजीकरण गरेको ।
२.		○
३.		○
४.		○

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	अधिल्लो आ.व.मा भएको खर्च	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना									
चाचरा खा.पा	वडा नं ५ लाना	३७,३३,४०६।०८	१८३०६६२	८८७४४६	९,४३२१६	०	१११३५३७	१११३५३७	२५६
उदपुर्ण खा.पा.	वडा नं ५ लाना	१,१२३८८४६	५०९३८९१	३५४३५२३	१५५०३६८	०	३१२५३२९	३१,२५,३२९	४४१
उदगाडा खा.पा	वडा नं ५ लाना	१७,७९२०१६९	५८८०००	०	३७२०००	२१६०००	६६६९७७	६,६६,९७७	७८
गुडगुडे र जेवलेखोला खा.पा	वडा नं ३ घागल	५९,२७४८०।५८	१६५७४१६	०	९४५४१६	७१२०००	२१९३१६८	२१,९३,१६८	३७४
चौताडी खा.पा	वडा नं ५ लाना	८६,८९३७३।२४	२२२६०००	०	१४०९०००	८१७०००	१८९४४२८	१८,९४,४२८	४०९
जम्मा :			११३९५९६९	४४३०९६९	५२२००००	१७४५०००	८९९३४३९	१११३५३७	
सुधारिएको चुलो र च्याग									
निगाला सिचाई योजना	वडा नं ५ लाना	६३,६२,६९१।०६	१३४७०००	०	३७०००	१३१००००	१९०३०७७	१,९०३,०७७	१९३
भेल्छडा सिचाई योजना	वडा नं ५ लाना	४३,८२६५६।०६	९६३०००	६५६७८८	९६३०००	०	९२४३२०	९,२४,३२०	२१३
जम्मा :			२३१००००	६५६७८८	१००००००	१३१००००	२८२७३९७	१,९०३,०७७	
केदारेश्वर उ.मा.वि. रन्तोला छात्रा शौचालय निर्माण									
केदारेश्वर उ.मा.वि. रन्तोला छात्रा शौचालय निर्माण	वडा नं ५ लाना	९,२३,४८३।७२	७४१५८४	२९४७८४	३९३९०१	५२८९९	०	०	३००
मेलघट्टी आ.व. अतरकाडा छात्रा शौचालय निर्माण	वडा नं ५ लाना	१२,०३६१४।७३	९०६०४७	०	६५६०४७	२५००००	५९४९७३	५९४९७३	९३
जम्मा :			४४२४८७६	०	२५६२०३८	१८६२८३८	०		

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	बडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	परियोजना अभिमुखिकरण तालिम	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	१४	७	१	०	४३	७४
२	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	२४	३	०	०	५८	६
३	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण तालिम	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	१०	९	०	१	४६	८१
४	उपभोक्ता व्यवस्थापन तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	१	१	०	०	०	५	१७
५	पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिम	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	१०	४	०	१	४३	४१
६	निर्माण पूर्वको गोष्ठि	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	८	२	०	०	५७	५८
७	सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण गोष्ठि तथा कार्ययोजना अनुमोदन	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	५	३	०	०	६३	९१
९	सार्वजनिक सुनुवाई दोश्रो	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	११	३	०	०	५१	६७
१०	योजना स्तरिय दोश्रो अनुगमन	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	५	१		०	०	१	६
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	चर्पी दिवश	३ र ५ लाना घागल	२०७५ मंसिर ३ गते	१	५	४	१८	१०	३०	३०
२	महिनावारी स्वच्छता दिवश	३ र ५ लाना घागल	२०७६ जेठ १४ गते	२	३०	८	६	८	१४०	१९
३	२० औँ राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह	३ र ५ लाना घागल	२०७६ २२ देखि २८	२	३७	२६	३४	३९	१३२	१२८
४	नारी दिवश	३ र ५ लाना घागल	फाल्गुन २४ गते	२	४५	५७	२३	३४	६०	६१
५										
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम	३ र ५ लाना घागल	३ दिने	१८	७२	९	४८	१५	२०५	६८
२	घरवारी व्यवस्थापन पुर्नताजगी तालिम	३ र ५ लाना घागल	१ दिने	१२	४३	२६	९	३८	१५०	५१
३	प्लाष्टिक घर निर्माण	३ र ५ लाना घागल	१ दिन	१४	०	०	०	०	०	१४
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	स्थानिय स्रोत व्यक्ति तालिम	३ र ५ लाना घागल	७ दिने	०	०	०	०	०	१	०
२	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	३ र ५ लाना घागल	११ दिन	०	०	०	०	०	५	२

जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	उपभोक्ता व्यवस्थापन तालिम	३ र ५ लाना घागल	३ दिने	१	१	०	०	१	६	१७
२	बहुउद्देश्य नसरी व्यवस्थापन तालिम	दिपायल	७ दिन	०	१	०	०	०	०	४
३	सुधारिएको चुलो प्रबृद्धक तालिम	वडीकेदार गा.पा	७ दिने	०	१	२	०	१	८	१२
४	खानेपानी सरसफाई तथा सुसासन तालिम	वडीकेदार गा.पा	३ दिने	१	१०	१२	२३	१८	७८	८८
५	अगुवा कृषक तालिम	वडा नं ५ अतरकाडा	५ दिने	१	१	०	३	०	८	३

अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्ययोजनाहरुको अवस्था

क्र.स	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न बर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोष को रकम	योजना को अवस्था	कैफीयत
१	सुलाडा खा.पा	०७३।०७४	२३८९५५६।०८	Gravaty	मोहन ब. मल्ल	१०००००	राम्रो	
२	भवानी भावर खा.पा	०७४।०७५	४८,३७५.७४२	Gravaty	पदम ब. चन्द	४२०००	राम्रो	
३	थापलेखोला उल्टेचौर खा.पा	०७४।०७५	७२०४१०५।	Gravaty	उपेन्द्र घर्ती मगर	५००००	राम्रो	
४	चाल्नेछेडा खा.पा	०७४।०७५	३६,२०३३३.७६	Gravaty	गणेश ब. विष्ट	२२०००	राम्रो	
५	चाचरा खा.पा	०७५।०७६	३७,३३,४०६।०८	Gravaty	देवा देवि चन्द	३००००	राम्रो	भुक्तानी बाकी
६	उदपुर्ण खा.पा.	०७५।०७६	१,१२३८८४६	Gravaty	पदम ब. बोहरा	९६०००	राम्रो	भुक्तानी बाकी
७	उदगडा खा.पा	०७५।०७६	१७,७९२०।९६९	Gravaty	चक्र ब. चन्द	२००००	राम्रो	
८	गुडगुडे र जेवलेखोला खा.पा	०७५।०७६	५९,२७४८०।५८	Gravaty	डिल ब. जेठारा	४८०००	राम्रो	
९	चौताडी खा.पा	०७५।०७६	८६,८९३७३।२४	Gravaty	लाल ब. सिगाल	६४०००	राम्रो	
१०	निगाला सिचाई योजना	०७५।०७६	६३,६२,६९१।०६	परम्परागत	रुद्र ब. बोहरा	३२०००	राम्रो	
११	भेल्छडा सिचाई योजना	०७५।०७६	४३,८२६५६।०६	परम्परागत	टेकेन्द्र ब. बोहरा	११९९६	राम्रो	भुक्तानी बाकी

१२	केदारेश्वर उ.मा.वि. रन्तोला छात्रा शौचालय निर्माण	०७५।०७६	९,२३,४८३।७२	परम्परागत	गणेश जोशी	०	राम्रा	
१३	मेलघट्टी आ.व. अतरकाडा छात्रा शौचालय निर्माण	०७५।०७६	१२,०३६१४।७३	परम्परागत	प्रकाश थापा	०	राम्रा	

अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फर्छ्यौट भइ बाँकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत
६२१८	०	६२१८	असुल उपर गर्नु पर्ने रकम

अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व.०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये ०७५।०७६ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
६२१८	०	६२१८	

उदपुर्ण खा.पा योजना निर्माण,सरसफाई र जिविकोपार्जनमा सुधार

डोटी जिल्लाको वडीकेदारगाउँपालिका वडा नं. ५ लानाको उदपुर्ण खा.पा योजनामा पर्ने टोलहरुमा (वगरगाडा , दुधिला , कापडा, कराल, भुवनेसैन, चौका, ओखड्नी,) विगतको ४ वर्ष पहिले खानेपानी संरचना, घरबारी व्यवस्थापन, सरसफाई अवस्था एकदम नाजुक थियो । उदपुर्ण खा.पा . योजनामा कम्तीमा घरधुरीमा ८० मा ४४१ लाभान्वित जनसंख्यामा छन् । उदपुर्ण खा.पा वस्तीमा बसोबास गर्ने बालक देखि वृद्ध अवस्थामा खानेपानीमा अपुग , घरबारी व्यवस्थापन, सरसफाईमा कमी भई पानी जन्य रोग बाट मानवजन्यमा विभिन्न किसिमका रोगहरु भाडापखाल, आउ, हैजा , शरिरमा खटिरा, बच्चामा कुपोषण जस्ता रोगहरु शिकार भएको आ.व.२०६३-२०७० कम्तीमा ६० देखि ७० जना जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ । । नेपाल आफैमा अविकसित देश हो त्यसमा पनि डोटी जिल्ला राज्यबाट एकदमै पछिपारीएको अविकसित क्षेत्र हो । यहाँका अधिकांश महिला तथा पुरुष बेरोजगारीको चपेटा परेकाछन् यस क्षेत्रमा थुप्रै स्रोत साधन छन ।तर त्यसको सही पहिचान तथा सदुपयोग र प्रयोजन हुन सकिरहेको छैन जसको कारण डोटी जिल्लाका वडिकेदार गा.पा वडा नं ५का महिला र पुरुष मानीसहरु बेरोजगारीको चपेटामा परेकाछन् यहाका मानिसहरुको जिविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम भनेको कृषि तथा पशुपालन हो । प्राविधिक ज्ञानसिपको अनभिज्ञता तथा उन्नत विउविजनको अभाव सबै क्षेत्रमा यातायातका साधनहरुको पहुच नपुग्नु तथा यस क्षेत्रमा उत्पादीत वस्तुले मुल्य नपाउनु का कारण कृषि पेशाबाट परिश्रम अनुसारको उत्पादन नहुने हुँदा यस क्षेत्रका अधिकांश महिला तथा पुरुष परिवारको जीविकोपार्जन का लागि भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागी वर्षौ देखी जाने आउने क्रम चल्दै आएको छ। र वडीकेदार गा.पा. सावि.क.लाना वितका वर्षदेखि खानेपानी संरचना , सरसफाई बानी व्यवहोरा जनचेतना क्रिडाकलापहरु तालिम गोष्ठी, संरचना निर्माण सरकारी तथा गैरसरकारीले कार्यक्रमहरु संचालन नगरिएको समुदायको भनाई छ ।

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन तेस्रो चरण वडीकेदार गा.पा वडा नं ५ लानामा आ.व. ०७४ मा समन्वय तथा सहकार्य गरी कार्यक्रम शुरुवात गर्ने प्राथमिकता राखियो । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन तेस्रो चरणले खानेपानीको संरचना, जिविकोपार्जन, सरसफाई बानीव्वहोरा कार्यक्रम ल्याई आ.व. ०७४।०७५ मा वडीकेदार गा.पा.को वडा नं १ देखि ५ सम्म पानीका स्रोत तथा लाभान्वित जनसंख्या टोलवस्तीको जब गुरुयोजना तयार गरी गुरुयोजनाको प्राथमिकता अनुसार वडा नं ५ लानाको उदपुर्ण खा.पा योजनामा पर्ने टोलहरुमा (वगरगाडा ,दुधिला , कापडा, कराल, भुवनेसैन, चौका, ओखड्नी , लाई समेट्ने गरी घरधुरी संख्या ८० लाई शुरुवात गरी खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धतिमा क्रियाकलापमा समुदायस्तर (परियोजना अभिमुखिकरण तालिम, घरबारी व्यवस्थापन तालिम, लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण तालिम, उपभोक्ता व्यवस्थापन तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धी तालिम, निर्माण पुर्बको गोष्ठी, सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण गोष्ठी तथा कार्ययोजना अनुमोदन, निर्माण अबधिको गोष्ठी, सार्वजनिक सुनुवाई पहिलो, दोश्रो, अन्तिम, योजना स्तरिय

गा.पा सहयोगी संस्था दातृनिकाय बाट अनुगमन भएको पाईन्छ । खानेपानी निर्माणका संगै खानेपानी मर्मत सम्भार र त्यसको दिगोपन बहुउपयोगीमा प्रयोग कृषिजन्य सिचाई घरबारी व्यवस्थापन सरसफाई, खानेपानी, गाईवस्तु, व्यक्तिगत सरसफाईमा प्रयोग भएको पाईन्छ । कृषिजन्यमा ओखलपुर, सम्भुना, हरियाली घरबारी व्यवस्थापन समुह गठन गरी ८० वटा घरधनिका विशेष गरी महिलालाई घरबारी व्यवस्थापन तालिम दिई बेमोसमी तरकारी उत्पादन गरी जिविकोपार्जनमा वृद्धि भएको पाईन्छ । डोटी जिल्ला को खुल्ला दिशा मुक्त घोषण पश्चात वडिकेदार गा.पा वडा नं. ५ लानाका उदपुर्ण खा.पा योजनामा पर्ने टोलहरुमा (वगरगाडा , दुधिला , कापडा, कराल, भुवनेसैन, चौका, ओखडनी मा पुण सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रमा सुरक्षित र बानीव्यवहोरामा प्रत्येक घरमा चर्पीको समुचित प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाई, खानेपानीको सुरक्षित प्रयोग र घरायसी तथा संस्थागत सरसफाईमा सुधारिएको चुलो च्यागं र जुठ्यानको व्यवस्था , फोहोर फाल्ने खाल्डोको व्यवस्था , करेसाबारीको प्रयोग, गोठमलको व्यवस्था , महिनावरी भएको बेला महिला चर्पीको प्रयोग , वातावरण सरसफाई भएको सुधार भएको पाईन्छ । यस लानाको सा.वि.क वडा नं ९ लाई पुर्ण सरसफाई उन्मुख क्षेत्र घोषण गर्ने आ.व. २०७६ भदौमा लक्ष्य राखेको छ ।

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणले वडिकेदार गा.पा वडा नं ५ उदपुर्ण खा.पा योजनामा पर्ने टोलहरुमा (वगरगाडा , दुधिला , कापडा, कराल, भुवनेसैन, चौका, ओखडनी मा २ वर्ष कामगरी समुदाय स्तर क्षमता विकास, खानेपानीको प्रयोग , सरसफाई बानी व्यवहोरा परिवर्तन, घरबारी व्यवस्थापनमा सुधार आई जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याएको पाईन्छ ।

अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी - घरबारी , सरसफाई, संरचना निर्माण



वडा नं ३ प्रगतीशील घरबारी व्यवस्थापन समूहले नर्सरी स्थापना	वडा नं ३ गैमडा कृषक समूहमा विउ विजन वितरण
	
वडीकेदार गा.पा वडा नं ३ मा घरबारी व्यवस्थापन समूहको तालिममा नर्सरी स्थापना	वडीकेदार गा.पा वडा नं ३ मा घरबारी व्यवस्थापन समूहको तालिममा नर्सरी स्थापना
	
नर्सरी स्थापना	नर्सरी स्थापना
	
Figure 1 Water saftey plan observat	Figure 2 WUG PSO Monotring at lana



Figure 3 PSO & RM level WUG chhachara Monotring At Lanakedarshwar



Figure 4 PSO Monotring Nigala irrigation at lana



वडीकेदार गा.पा वडा नं ५ लानाको चाचरा खा.पा को समुदायहरु मेनलाईन खन्दै



वडीकेदार गा.पा वडा नं ५ लानाको उदपुर्ण सेलानीको खा.पा योजनाको टंकी संरचना निर्माण हुदै



वडीकेदार गा.पा वडा नं ५ लानाको मेलघट्टी आ.व. छात्रा शौचालय ढलान हुदै



वडीकेदार गा.पा वडा नं ५ लानाको चाचरा खा.पा को समुदायहरु मेनलाईन खन्दै



गाउँपालिका स्तरीय सुधारिएको चलो निर्माण तालिम



पूर्ण सरसफाई प्रवर्द्धनको लागि फोहोर फाल्ने खाल्डो निर्माण



च्यांग र जुटुयानको प्रयोग



च्यांग र जुटुयानको प्रयोग




२० औं राष्ट्रिय सरसफाई दिवश वडा नं ३ घागल मनाउँदै


२० औं राष्ट्रिय सरसफाई दिवश वडा नं ३ घागल मनाउँदै



महिनावरी ससफाई दिवश वडा नं ३ घागलमा जनाउँदै

महिनावरी ससफाई दिवश वडा नं ५ लानाकेदारेश्वर जनाउँदै

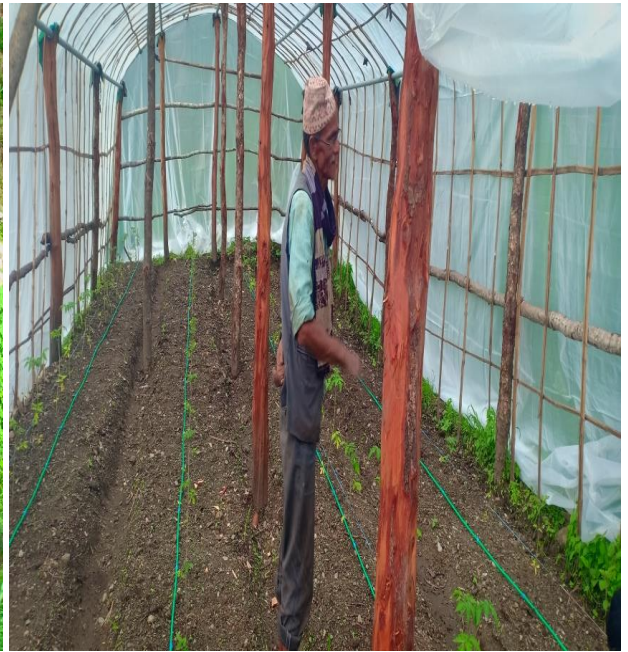

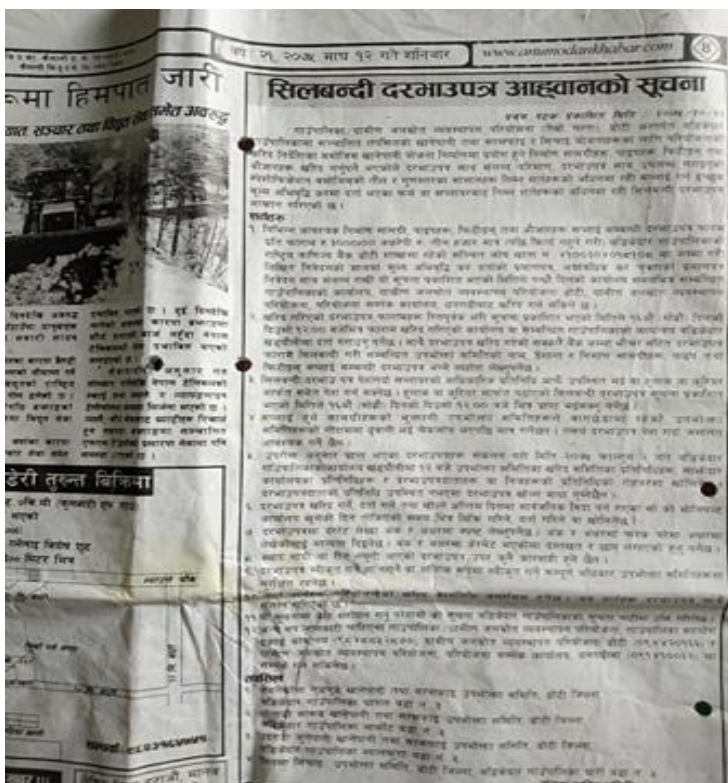

बाह्य सामाग्री खरीदको लागी कोटेशन आह्वानको सूचना

उदपुर्ण सेलाने खा.पा. योजनाको उद्घाटन कार्यक्रम

अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

क्र.स.	कर्मचारीहरुको नाम	ठेगाना	पद	योग्यता	सम्पर्क नं
१	तिलक मल्ल	बडिकेदार गा.पा. ५	जलस्रोत अधिकृत	स्नातक तह	९८४८५३६९५३
२	नरेन्द्र बिष्ट	द.न.पा. १० बैतडि	वरिष्ठ प्राविधिक सहजकर्ता	सब ईन्जिनियर	९८४८८५८७७
४	भूपट ब. बोहरा	पूर्वीचौकी गा.पा. ३ गैरागाउ	फिल्ड संयोजक	वि.एड् पास	९८६२२७२९६७
५	गणेशराज जोशी	वडीकेदार गा.पा वडा नं ५ लाना	फिल्ड संयोजक	एम एड् पास	९७४९००९९९६
६	विमला बम	वडीकेदार गा.पा वडा नं २ वछैन गरभुजा	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	वि.एड् पास	९८४८६३३५५८
७	चक्र खत्री		जलस्रोत प्राविधिक	प्रवीणता तह	९८६५७७०९००
८	खेम मल्ल	वडीकेदार गा.पा वडा नं ३ घागल	जलस्रोत प्राविधिक	टि. एस एल सी	९७४९६४४९४९
